

地域の皆さまへ

先月までに土留支保工撤去（１、２段目）の施工が完了しました。また壁コンクリート（３段目）の鉄筋組立、型枠組立を行ない、壁コンクリート（３段目）の打設を４回行いました。今月は壁コンクリート（３段目）の打設を８回行う予定です。

月間工程表にあるようにコンクリートミキサー車などの大型車両が 7:30 頃に 5 台現場に出入りします。その後 8:30 以降に引き続きコンクリートミキサー車が 50 台程度往来します。また、鉄筋、型枠資材を運搬する大型車両が 5 台程度出入り予定です。

コンクリートミキサー車および鉄筋、型枠資材を運搬する大型車両の運行に際しては、車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。江口酒屋店前の交差点で別途工事のため、工事車両が迂回路を通行する時期があります。


山留支保工撤去完了、型枠支保工状況



鉄筋工状況



進捗図

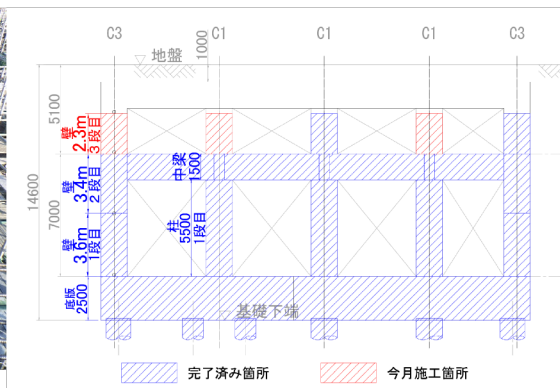


月間工程表

[illegible]

(はコンクリートミキサー車が現場に出入りする予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。)

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

フロー図

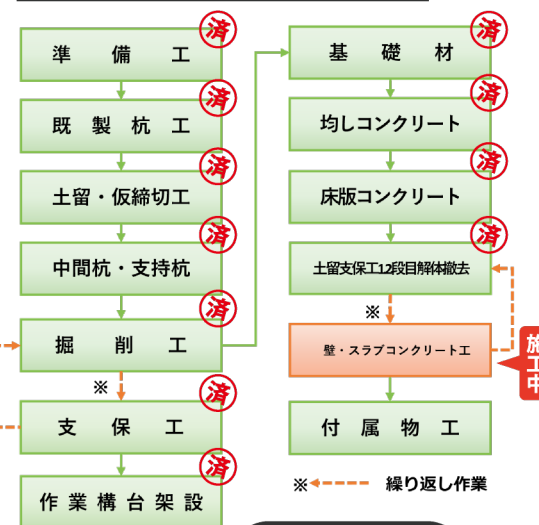

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・清水

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅 J V

TEL.025-383-6471

担当 坂本・日向（ひゅうが）

工事の詳しい内容をホームページで公開しています！
スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

