

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



令和7年
12月号

地域の皆さまへ

先月は壁コンクリートの鉄筋組立、型枠組立を行い壁コンクリート工の打設を8回行って3段目の壁コンクリートの施工を完了しました。また、11月中旬頃より※スラブコンクリート工の作業に着手しました。

今月は引き続きスラブコンクリート工の鉄筋組立、型枠組立を行いスラブコンクリートの打設を2回行う予定です。

月間工程表にあるようにコンクリートミキサー車などの大型車両が7:30頃に6台現場に入ります。その後8:30以降に引き続きコンクリートミキサー車が130台程度往來します。また、鉄筋、型枠資材を運搬する大型車両が5台程度出入り予定です。

コンクリートミキサー車および鉄筋、型枠資材を運搬する大型車両の運行に際しては、車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。江口酒屋店前の交差点で別途工事のため、工事車両が迂回路を通行する時期があります。※スラブコンクリートとは調整池の蓋をするコンクリートのことです。


鉄筋工状況



壁コンクリート状況



進捗図

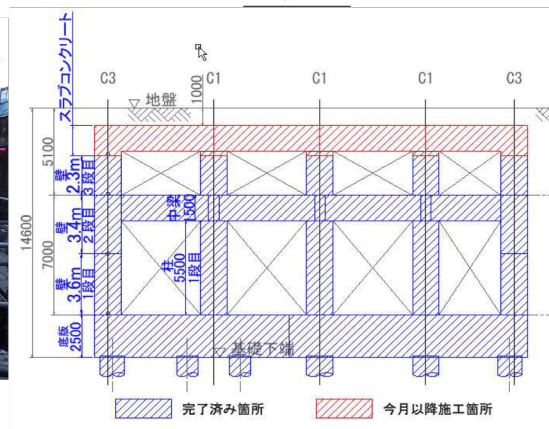

フロー図



月間工程表

月 日 作業内容	12月																															
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	
スラブコンクリート工 鉄筋型枠工、型枠支保工設置																																
スラブコンクリート工 コンクリート打設工																																

(■はコンクリートミキサー車が現場に出入りする予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。)

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・清水

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL. 025-383-6471
担当 坂本・日向 (ひゅうが)

工事の詳しい内容をホームページで公開しています！
スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

