

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



令和8年
9月号
【最終】


地域の皆さまへ

先月は調整池内部のコンクリート打設、型枠支保工の解体、清掃、防水工を行いました。 ※
 今月は、調整池内部の型枠工、清掃工、階段手摺設置工等を行います。また、調整池内部のシンダーコンクリート打設を2回行い全工事完了予定です。(残務処理、現場事務所解体撤出は10月末まで)
 コンクリートを打設する日は、コンクリートミキサー車などの大型車両が7:30前に5台現場に入ります。その後8:30以降、引き続きコンクリートミキサー車が30台程度出入りする予定です。
 コンクリートミキサー車及び型枠資材を運搬する大型車両の運行に際しては、車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。今回をもって松浜雨水ポンプ場調整池工事だよりは最終号となります。今までご理解とご協力いただき、ありがとうございました。 ※ シンダーコンクリートとは、調整池へ流入した雨水をポンプピットへ集めるため、調整池の底版に勾配をつけるコンクリートです。

南側調整池完成写真




進捗図

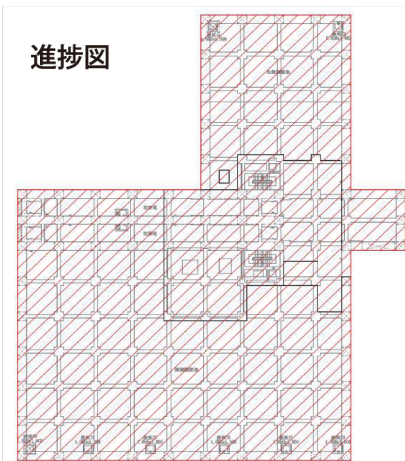

今月施工箇所
 その他、調整池内部のシンダーコンクリート工清掃、階段手摺工等

フロー図

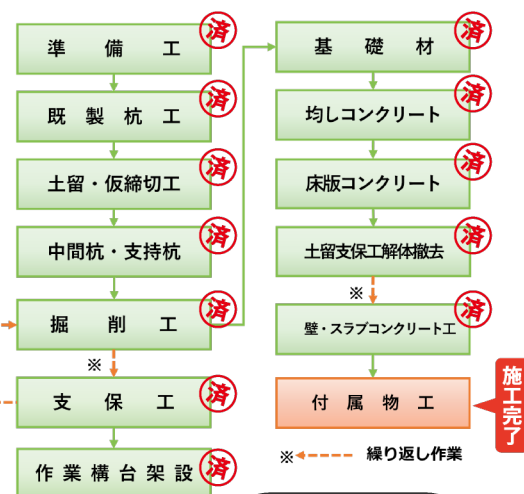

月間工程表

月 日	9月																													
作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
型枠工、清掃等、階段手摺工																														
坑内シンダーコンクリート打設工																														

※ 黒色はコンクリートミキサー車が現場に出入りする予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
 下水道管理センター施設整備課
 TEL. 025-281-9202
 担当 施設係 媚山・清水

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL.025-383-6471
 担当 坂本・日向 (ひゅうが)

工事の詳しい内容をホームページで公開しています！
 スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

