

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより




地域の皆さまへ

2月初旬から行っている3次掘削は3月中旬に完了する予定です。3段目支保工は3月下旬に完了し、4月より4次掘削を開始する予定です。3次掘削、4次掘削中は小型機械を使用したコンクリートの取壊し作業を引き続き行いますが、騒音や振動を測定しながら丁寧に作業を行うとともに土砂運搬に際しては、引き続き安全運転に努めますのでご理解とご協力をお願いいたします。

2月時点の現場状況写真



フロー図

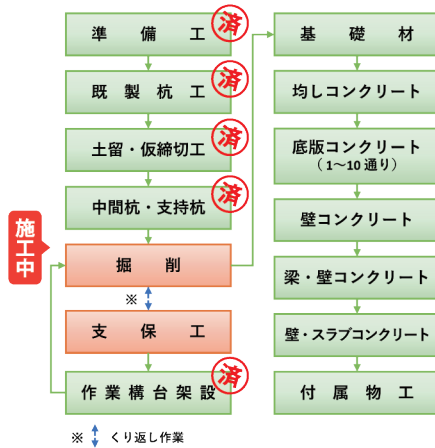

騒音、振動測定について

作業ヤード内で掘削及び積込み、立坑内コンクリートはつり時を主に全作業の騒音、振動をリアルタイムに測定しデータを蓄積しています。測定された結果は基準値内に収まっていますが、現場では更なる騒音・振動の低減に努めてまいります。



掘削土積込作業



ヤード外地元住民公表用騒音、振動値表示



コンクリートの取壊し作業 ヤード内騒音、振動値表示



月間工程表

月日	3月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
作業内容	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
3次掘削工																															
支保工3段目																															

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設管理課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・本橋

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL. 025-383-6471
担当 坂本・日向 (ひゅうが)

工事の詳細内容をホームページで公開しています! スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください!

