

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



令和7年
5月号

地域の皆さまへ


先月から壁・柱コンクリートの施工を開始し、壁・柱コンクリート35ヶ所中6ヶ所を打設しました。今月も引き続き壁・柱コンクリートを18ヶ所打設し累計で24ヶ所完了する予定です。

月間工程表にあるように壁・柱の鉄筋を組み立てながらコンクリートの打設を6回行う予定です。それに伴いコンクリートミキサー車などの大型車両が7:30頃に5台現場に入ります。その後8:30以降に引き続きコンクリートミキサー車が50台程度往來します。

先月より行っている土留支保工の一部解体作業は引き続き施工いたします。鋼材を運搬する大型車両（トレーラー）は月末に1日1台程度出入りする予定です。

コンクリートミキサー車、トレーラーなどの大型車両の運行に際しては、車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。

土留鋼材3段目一部、4段目全て撤去

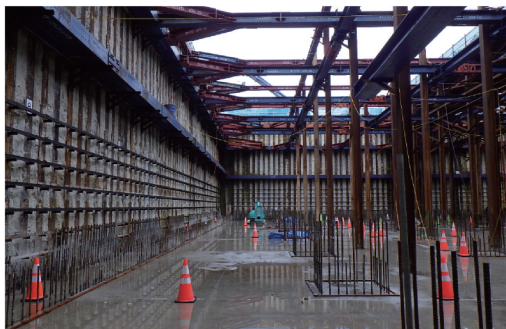


坑内型枠支保工設置状況



壁・柱鉄筋組立状況



フロー図

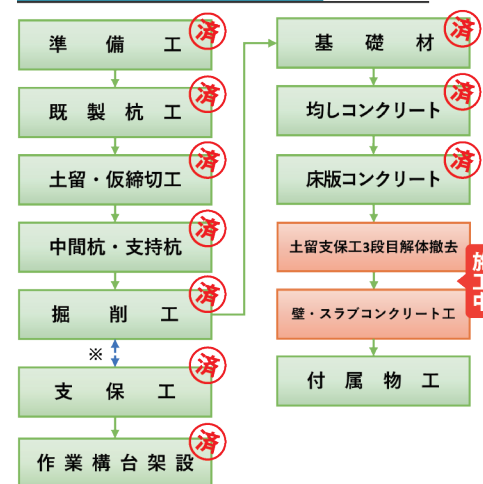

月間工程表

月 日		5月																														
作業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
壁、柱コンクリート工 鉄筋型枠工、足場支保工設置																																
壁、柱コンクリート工 コンクリート打設																																
土留支保工3段目解体撤去																																

(■はコンクリートミキサー車が現場に入出入りする予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。)

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・清水

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL. 025-383-6471
担当 坂本・日向（ひゅうが）

工事の詳しい内容をホームページで公開しています！
スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

