

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



令和7年
6月号

地域の皆さまへ

先々月から壁コンクリート（1段目）の施工を開始し、35カ所中27カ所完了しました。今月も引き続き壁コンクリートを8カ所打設し、1段目の施工は完了する予定です。新たに柱のコンクリートも打設いたします。月間工程表にあるように壁、柱の鉄筋を組み立てながらコンクリートの打設を11回行う予定です。それに伴いコンクリートミキサー車などの大型車両が7:30頃に5台現場に出入りします。その後8:30以降に引き続きコンクリートミキサー車が50台程度往来します。コンクリートミキサー車、大型車両の運行に際しては、車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。


坑内型枠支保工設置状況



壁コンクリート一部打設完了状況




壁鉄筋組立状況

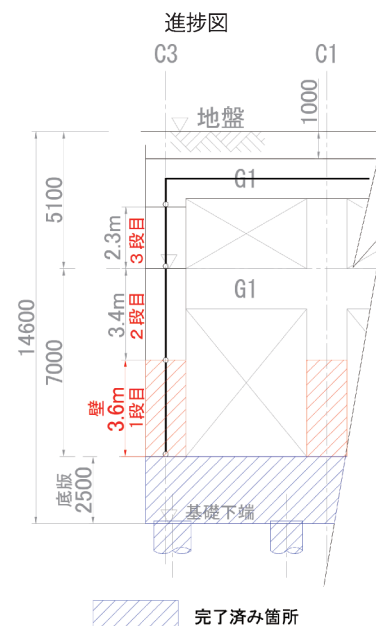

完了済み箇所

フロー図

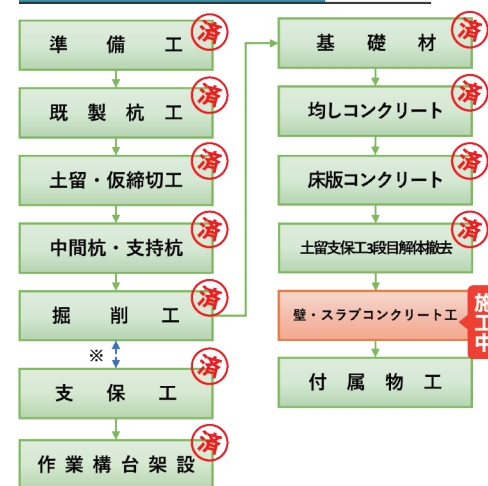

月間工程表

作業内容	6月																													
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
壁、柱コンクリート工 鉄筋型枠工、型枠支保工設置																														
壁、柱コンクリート工 コンクリート打設																														

(■はコンクリートミキサー車が現場に出入りする予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。)

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・清水

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅 JV
TEL.025-383-6471
担当 坂本・日向 (ひゅうが)

工事の詳しい内容をホームページで公開しています！
スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

