

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



令和7年
8月号

地域の皆さまへ

先月までに壁コンクリート（2段目）の施工は35ヶ所中28ヶ所完了し、柱コンクリート（1段目）は全56ヶ所完了しました。今月は壁コンクリート（2段目）を7ヶ所打設し2段目を完了、中梁コンクリートは149ヶ所中23ヶ所完了する予定です。

月間工程表にあるように壁、柱の鉄筋を組み立てながらコンクリートの打設を7回行う予定です。それに伴いコンクリートミキサー車などの大型車両が7:30頃に5台現場に出入りします。その後8:30以降に引き続きコンクリートミキサー車が50台程度往来します。

コンクリートミキサー車、大型車両の運行に際しては、車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。

坑内型枠支保工設置状況




壁鉄筋組立状況




壁コンクリート一部打設完了状況



進捗図

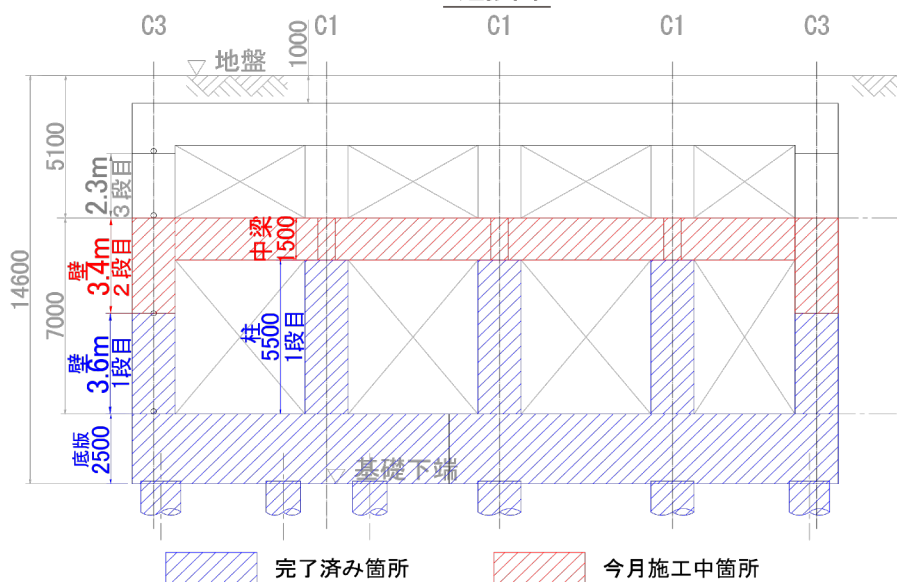

フロー図

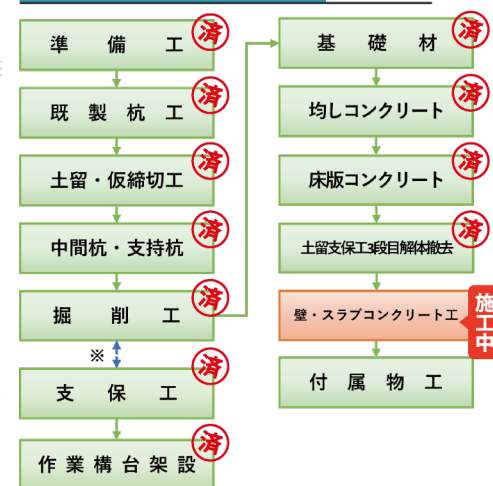

月間工程表

月 日		8月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
作業内容		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
壁、柱コンクリート工 鉄筋型枠工、足場支保工設置																																
壁、柱コンクリート工 コンクリート打設																																

(■はコンクリートミキサー車が現場に出入りする予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。)

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・清水

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL.025-383-6471
担当 坂本・日向（ひゅうが）

工事の詳しい内容をホームページで公開しています！
スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

