

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより




Vol. 08
2024年4月
発行


地域の皆さまへ

3次掘削工は3月中旬に完了し3段目支保工は3月下旬に完了しました。掘削深さは概ね8.3mとなり4月より4次掘削を開始します。4次掘削中は小型機械を使用したコンクリートの取壊し作業を引き続き行いますが、騒音や振動を測定しながら丁寧に作業を行うとともに土砂運搬に際しては、引き続き安全運転に努めますのでご理解とご協力をお願いいたします。

3月時点の現場状況写真

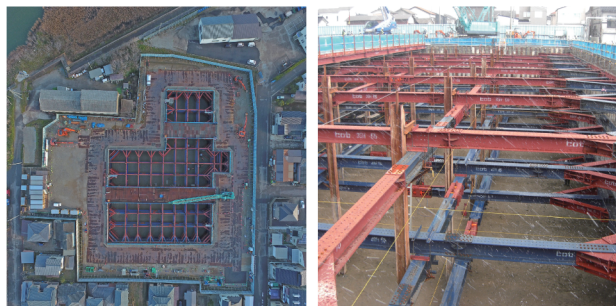


フロー図

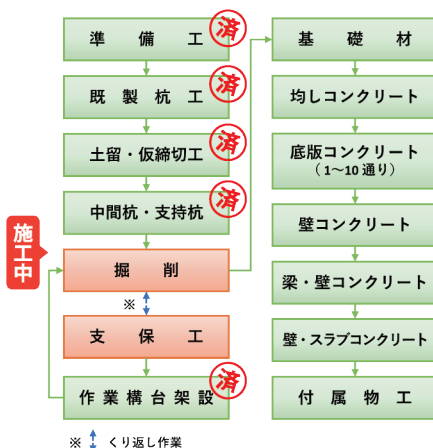

立坑内水位低下について

作業ヤード立坑内の地下水位を低下するために右写真の井戸を3箇所設置し運転しています。井戸は地下15m～35m付近の水を集水しており、3箇所の合計揚水量は50ℓ/分ぐらいです。地下水位を下げる目的は掘削時の作業環境改善と構造物の浮力対策です。立坑内の地下水位は地下16m程度で安定しており、急激な変化が生じていないか監視をしております。併せて立坑周辺の地下水位や地盤高も監視しており、周辺の地盤に影響があるかないかを常時確認しながら工事を安全に進めています。

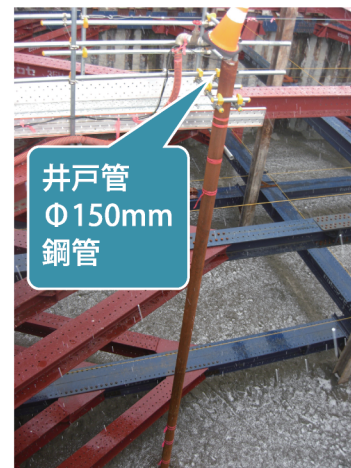

月間工程表

月 日 作業内容	4 月																													
	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火
4次掘削																														
支保工4段目																														

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・本橋

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL. 025-383-6471
担当 坂本・日向(ひゅうが)

工事の詳しい内容をホームページで公開しています! スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください!

