

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより




Vol. 10
2024年6月
発行


地域の皆さまへ

5次掘削（最終掘削）は5月下旬に開始する予定で掘削深さは概ね15.2mとなります。5次掘削は、7月上旬まで続き、その後、躯体のコンクリート打設工を行います。5次掘削中は小型機械を使用したコンクリートの取壊し作業を引き続き行いますが、騒音や振動を測定しながら丁寧に作業を行うとともに土砂運搬に際しては、引き続き安全運転に努めますのでご理解とご協力をお願いいたします。

5月時点の現場状況写真

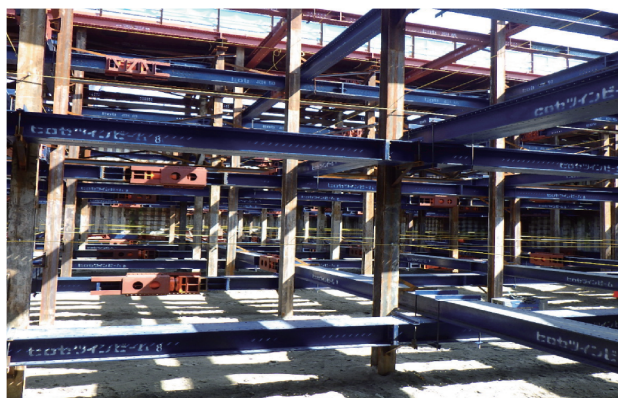

フロー図

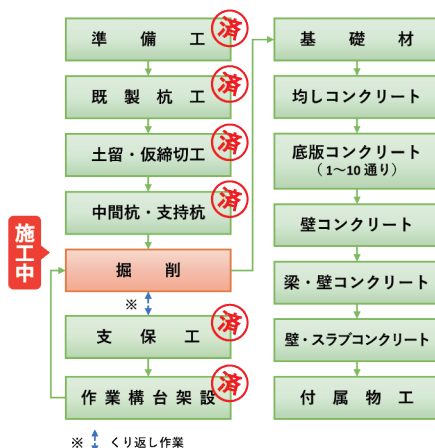

地盤変動対策

立坑内の土留支保工は4段設置しています。写真のように土留壁と支保工材の隙間に間詰コンクリートを詰めています。間詰コンクリートを詰めることによって土留壁にかかる土圧を支保工全体で受けられるようにしており、周辺の地盤変動を防止しています。あわせて、土留壁および周辺地盤の変位測定を定期的に行い、安全に工事を進めています。



月間工程表

月 日 作業内容	6 月																													
	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日
5次掘削																														

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・本橋

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅 JV
TEL. 025-383-6471
担当 坂本・日向（ひゅうが）

工事の詳細内容をホームページで公開しています！スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

