

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



令和8年
6月号

地域の皆さまへ

先月は調整池内部の型枠支保工の解体、清掃、防水工を行いました。

今月も引き続き、調整池内部の型枠支保工の解体、清掃、防水工を行います。また、防護コンクリートと調整池内部のシンダーコンクリートの打設を1回づつ行う予定です。型枠支保工資材を運搬する大型車両は、8:30以降に1台程度出入り予定です。また、コンクリート打設する日は、コンクリートミキサー車は、8:30以降に35台程度出入りする予定です。

大型車両の走行に関しては車両の走行スピードを落とすなど、引き続き騒音や振動を最小限度に抑え、事故を起こさないよう細心の注意を払いますのでご理解とご協力をお願いいたします。

※ シンダーコンクリートとは、調整池へ流入した雨水をポンプピットへ集めるため、調整池の底版に勾配をつけるコンクリートです。

※


南側調整池内部状況




スラブコンクリート状況（埋め戻し前）



進捗図

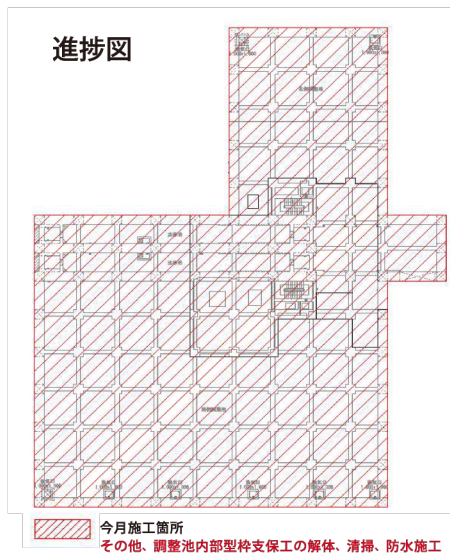

フロー図

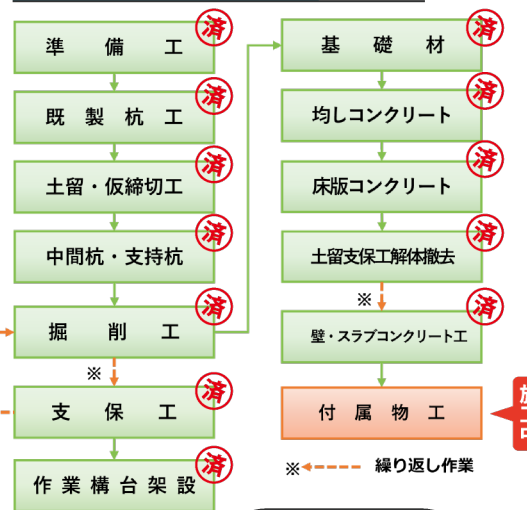

月間工程表

作業内容	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
型枠支保工解体、防水工、清掃等						■	■						■	■						■	■									
坑内シンダーコンクリート打設工 坑外立上り、防護コンクリート打設工																														

※ ■ はコンクリートミキサー車が現場に出入りする予定日です。悪天候、作業進捗によって変更となる場合があります。

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・清水

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL. 025-383-6471
担当 坂本・日向 (ひゅうが)

工事の詳細内容をホームページで公開しています！
スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

