

松浜雨水ポンプ場調整池工事だより



Vol. 11
2024年7月
発行


地域の皆さまへ

5次掘削は、7月中旬まで続き、その後、基礎材（砕石）の敷均し、掘削底面を水平にするための均しコンクリート工を行います。5次掘削中は小型機械を使用したコンクリートの取壊し作業を引き続き行いますが、騒音や振動を測定しながら丁寧に作業を行うとともに土砂および資材の運搬に際しては、引き続き安全運転に努めますのでご理解とご協力をお願いいたします。

6月時点の現場状況写真



フロー図

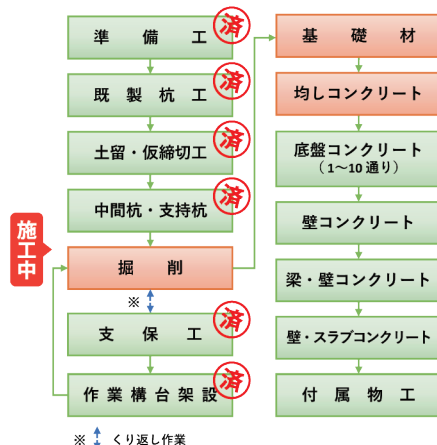

熱中症対策

6月に入ってから「・・・市の中学校で熱中症と思われることで・・・人が救急車で病院に搬送されました」などのニュースが流れたりします。

当現場でも熱中対策水（マグネシウム、ナトリウム等含有）を支給し熱中症対策に努めています。熱中症の症状の豆知識として例を紹介いたします。

写真①手の親指の爪を逆の指でつまみます。写真②つまんだ指を離した時、白かった爪の色がピンクに戻るのに3秒以上かかれば、脱水症を起こしている可能性大です。他の例で体内に水分を保持できる体を作るために、適度な運動で筋肉を付けましょう。

皆様も、もしよければ参考にして頂き暑い夏を健康で乗り切りましょう。



月間工程表

作業内容	7 月																																
	月 日																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
5次掘削																																	
基礎材																																	
均しコンクリート																																	

作業にあたっては安全や環境に十分に配慮するとともに、工事車両の通行に関しては、交通誘導員を配置するなど細心の注意を払います。何卒、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

お問い合わせ

発注者

新潟市下水道部
下水道管理センター施設整備課
TEL. 025-281-9202
担当 施設係 媚山・本橋

施工者

安藤ハザマ・機動・秋葉・小菅JV
TEL. 025-383-6471
担当 坂本・日向（ひゅうが）

工事の詳しい内容をホームページで公開しています！スマホ・タブレットで右のコードを読み取り、ご確認ください！

